


危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	液氮儲槽隔熱層真空量測接頭銹蝕致無法量測
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	危險性機械及設備安全檢查規則

1. 缺陷概述: 隔熱層真空量測接頭銹蝕，無法量測

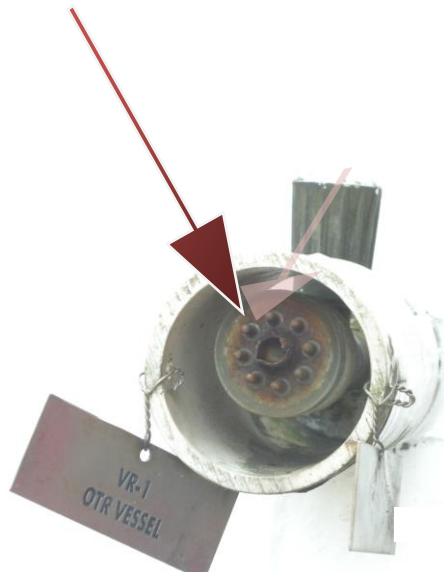

2. 改善及預防建議: 應予整修或換新，落實自動檢查
